

KUOPIO

Luola- Savilahden
liikunta- ja
tapahtumakeskus

KuntaLiike – tapaaminen
30.10.2025



Luola -Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus

- Rakennettu Savilahden kehittyvään kaupunginosaan vanhan asevarikon luolastoihin
- Savilahti on Kuopion kärkikehityskohde
- Pohjakäyttönä alueellinen väestönsuoja vajaalle 7000 ihmiselle
- Rauhan aikana toimii liikunta- ja tapahtumakeskuksena
- [Luola - Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus - Kuopio](#)



The entire cave is approximately
100 000 m³ in size

New cave system
Approx.

63 000 m³




Old cave system
Approx.

29 000 m³



Luola -Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus

- Iso hallin pinta-ala n. 3500 m²
 - Alue- ja pistejousto koko alalla (Taraflex Combi 38)
 - 2506 katsomopaikkaa, joista vajaa 500 kiinteitä, loput teleskooppimallilla
 - 3 isoa lohkoa, jokainen 44 m x 25 m
 - Päätylohkot jaettavissa puoliksi
 - Toisessa päädyssä yli 250 kiinteää paikkaa
 - Toimintaidea siten, että halli toimii kokonaisuutena tai pienemmissä osissa ongelmitta

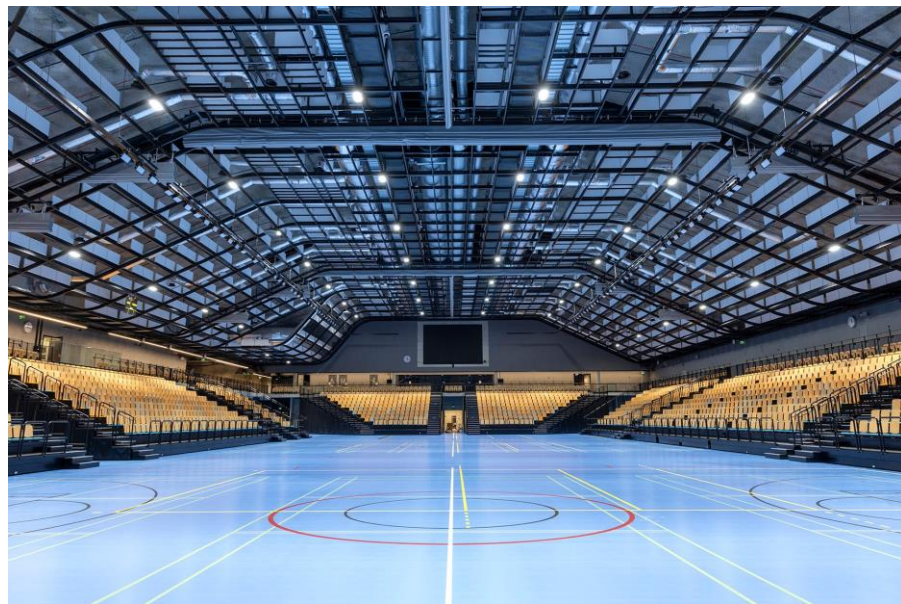

Luola -Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus

Muut tilat:

Kuntosali 370 m²

Ryhmäliikuntatila 307 m²

Kamppailulajit 500 m²


Paini 173 m²

Lämmittelyalue 100 m²

Monikäyttötila


Kahvio

10 pukuhuonetta

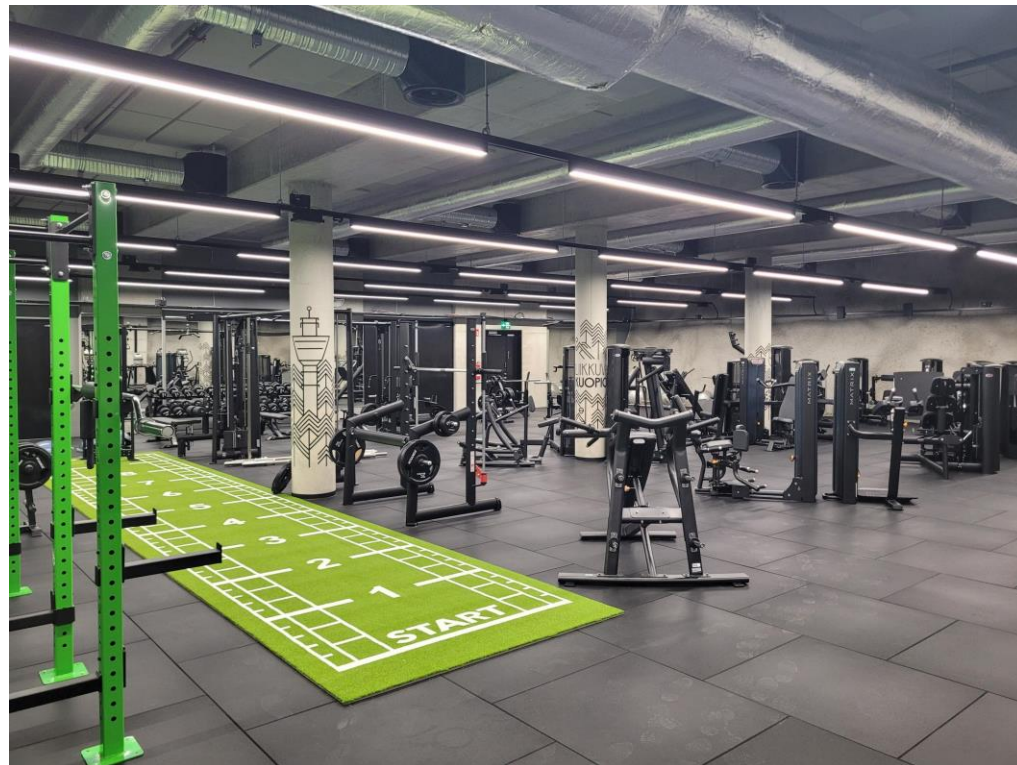

Luola – Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus

- Projektin kesto hankesuunnitelman valmistumisesta avaukseen n. 7 vuotta, luolaston hankinnasta 10 vuotta.
- Hankkeen kokonaiskustannus n. 50,2 M€ +käyttäjähankinnat 1 M€
- Avattiin yleisölle 14.8.2024
- Tavoite 300 000 -350 000 käyntikertaa vuodessa, ensimmäiset kolmetoista kuukautta n. 324 000 käyntiä
- Palautteet tiloista ovat olleet positiivisia, eniten keskustelua on herättänyt pysäköintijärjestelyt

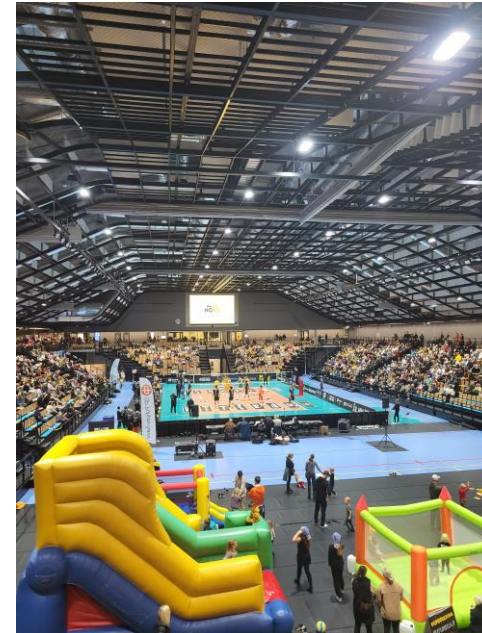

Oppeja hankkeesta

- Hankemallina yhteistoiminnallinen malli on hyvä silloin, jos mukana olevalla käyttäjään edustajalla on riittävästi tietoa
- Tilat tehdään käyttäjiä varten, liikunta/käyttäjäpuolen tärkein tehtävä on pitää kriittisissä asioissa käyttäjien puolta.
- Kaikkia toiveita ei voi täyttää, kompromisseissa perusteet on osattava kertoa
- Kysy kaikilta kaikkea – vie tiedot hankkeeseen
- Isoissa hankkeissa julkisuuskin voi olla isoa – fokuksen täytyy säilyä ja perusteet pitää osata
- Budjetoi käyttäjähankintoihin riittävästi euroja tilakohtaisesti
- Valmistumisen jälkeen on myös hyvä varata budjettia asioihin, joita suunnittelun / rakentamisen aikana ei huomattu. Näitä tulee varmasti.
- Isoon hankkeeseen on varattava riittävä määrä työaika ja resursseja

Liikuntapaikkarakentaminen osana vss-rakentamista

- Vaativaa erityisrakentamista – mistä osaajat löytyvät ja miten kustannusten ennakointi onnistuu?
- Kustannusten jako ja mahdolliset näihin liittyvät sopimuskuviot haastavia
- Perusteltavuus kaksikäyttöisyydellä voi olla helpompi kuin pelkällä liikunta-/urheilupaikkarakentamisella
- Viestintä tärkeää, mutta onnistuuko se varsinkaan budjettiylityksissä koskaan? Vaarana se, että vss-kulujen kasvaminen aiheuttaa negatiivista ilmapiiriä myös liikuntapuolen päälle
- VSS-aspekti kiinnostaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti, samalla myös liikuntatilat nousevat esille normaalia enemmän

Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden uusi slogan

“Viisaus ei asu meissä”
